
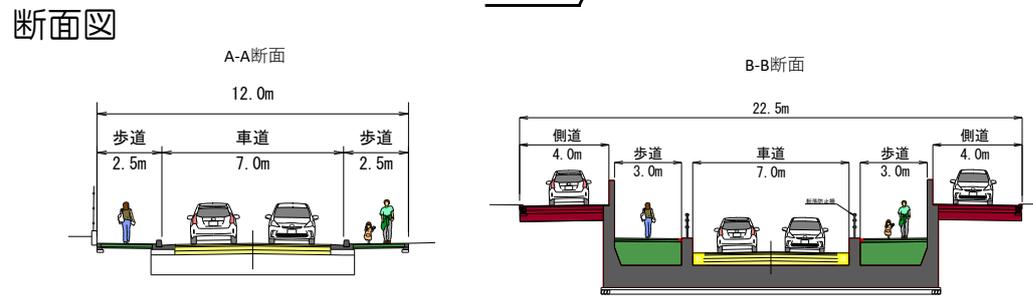


都市計画道路荻宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事 工事進捗状況について

令和5年8月吉日

工事概要

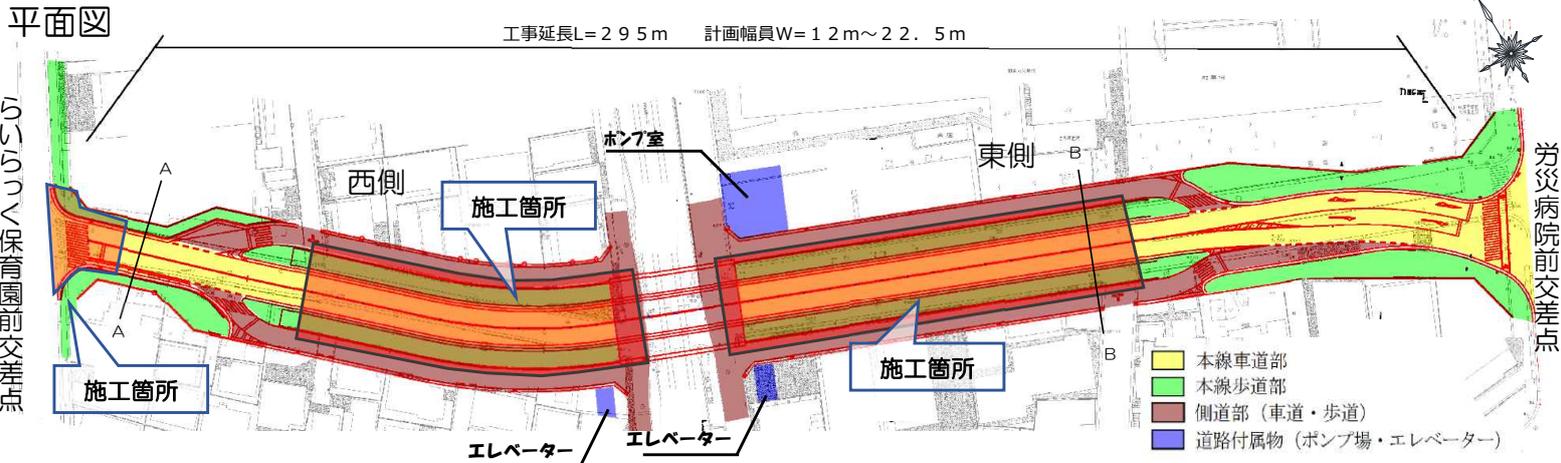

進捗状況(令和5年7月末時点)

～施工方法～

1. 切回し仮舗装工

2. 鋼矢板・中間杭打設工

3. 路面覆工工

4. 掘削・土留工

5. 擁壁工

6. 覆工板撤去/舗装工・排水工など

7. 道路附属物工など

現在

本工事は、「5. 擁壁工」を覆工板の下で進めております。

踏切直近で実施していた躯体（コンクリート）工事も無事に完了しました。

▽ 覆工板下の写真



▽ 覆工板下の写真



▽ 踏切直近の施工写真
(躯体(コンクリート)工事)



▽ 踏切直近の施工写真
(躯体(コンクリート)工事)



並行して、実施しているポンプ場築造工事も進んでおり、非常時のポンプ稼働に必要な発電機の導入が完了しました。

▽ ポンプ場の写真



▽ ポンプ場内部の写真
(非常用発電機)



「らいらっく保育園前交差点」部において、道路改良工事を並行して実施しており、新しい信号器等の設置を進めています。

▽ 交差点部の施工写真



▽ 交差点部の施工写真



通行止め(2回目)の終了について

本工事におきまして、令和5年6月から約2カ月、昼間の車両通行止め(2回目)を行っておりましたが、踏切直近の躯体工事が無事完了いたしましたので、**通行止めは一旦終了いたします。**迂回路を御利用いただくなど、御理解・御協力をいただき、ありがとうございました。

<ホームページ 二次元コード>



今後の予定

- 次回の通行止め(3回目)につきましては、来年の年明け頃から実施する予定です。詳細は、市HPおよび現場HPなどでお知らせする予定です。(通行止めの時間帯については調整中)
- 東急線沿いの側道については、次回の通行止め開始後、側道の工事が完了するまでは、終日通り抜けが出来なくなります。

皆様には、御不便をお掛けしますが、御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

御不明な点等がございましたら、下記の連絡先まで御連絡下さい。

■ 問合せ先

川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
フジタ・織戸共同企業体

TEL : 044-755-2277

TEL : 044-982-9091
