| 工種 | 切回道路タイプ |
|---|---|
| 準備工事 | A |
| 切回し仮舗装工 | A、B |
| 鋼矢板･中間杭打設工 | B、C |
| 路面覆工工 | B、C、D |
| 掘削･土留工 | D |
| 擁壁工<br>ポンプ室上屋 | B、D |
| 覆工撤去工 | D、E |
| 本線舗装<br>排水工 | D、E |
| エレベーター工 | E |
| 側道工事<br>補償工事 | E |
| 信号機･標識<br>設置工事 | |

令和2年6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　令和3年1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　令和4年1月　2月　3月　4月

**準備工事**
設計照査・計画・各種協議
基本測量、境界測量工
家屋調査工
信号感知器移設・大型標識撤去

**地元説明会開催**

**道路　仮舗装工事・仮排水工事**
道路切り回し（１回目）

**土留・仮締切工（北側）**
鋼矢板打設
中間杭打設
覆工工事
道路切り回し
（2回目　8月下旬）

**土留・仮締切工（南側）**
鋼矢板打設
中間杭打設
覆工工事
道路切り回し
（3回目　令和3年冬）
一部夜間工事あり

**覆工工事**
掘削・覆工架設
道路切替
（4回目）
踏切通行止有
（令和4年2月以降　約4か月間）

**掘削・土留工**
掘削及び残土搬出有
切梁腹起し工を同時施工
既存BOX部仮壁撤去

**一部　綱島街道側側道工事を着手**

| 交通規制の種類 | | |
|---|---|---|
| | A | 道路予定地を施工 |
| | B | 北側を施工 |
| | C | 南側を施工 |
| | D | 中央部を施工 |
| | E | 側道を施工 |
| | ⇔ | 本線車両通行止め |
| ※本線通行止め時間 | 通常部：9:00～17:00<br>鉄道近接部：21:00～翌5:00 | |

※交通規制の種類については、道路規制のご案内よりご覧いただけます。

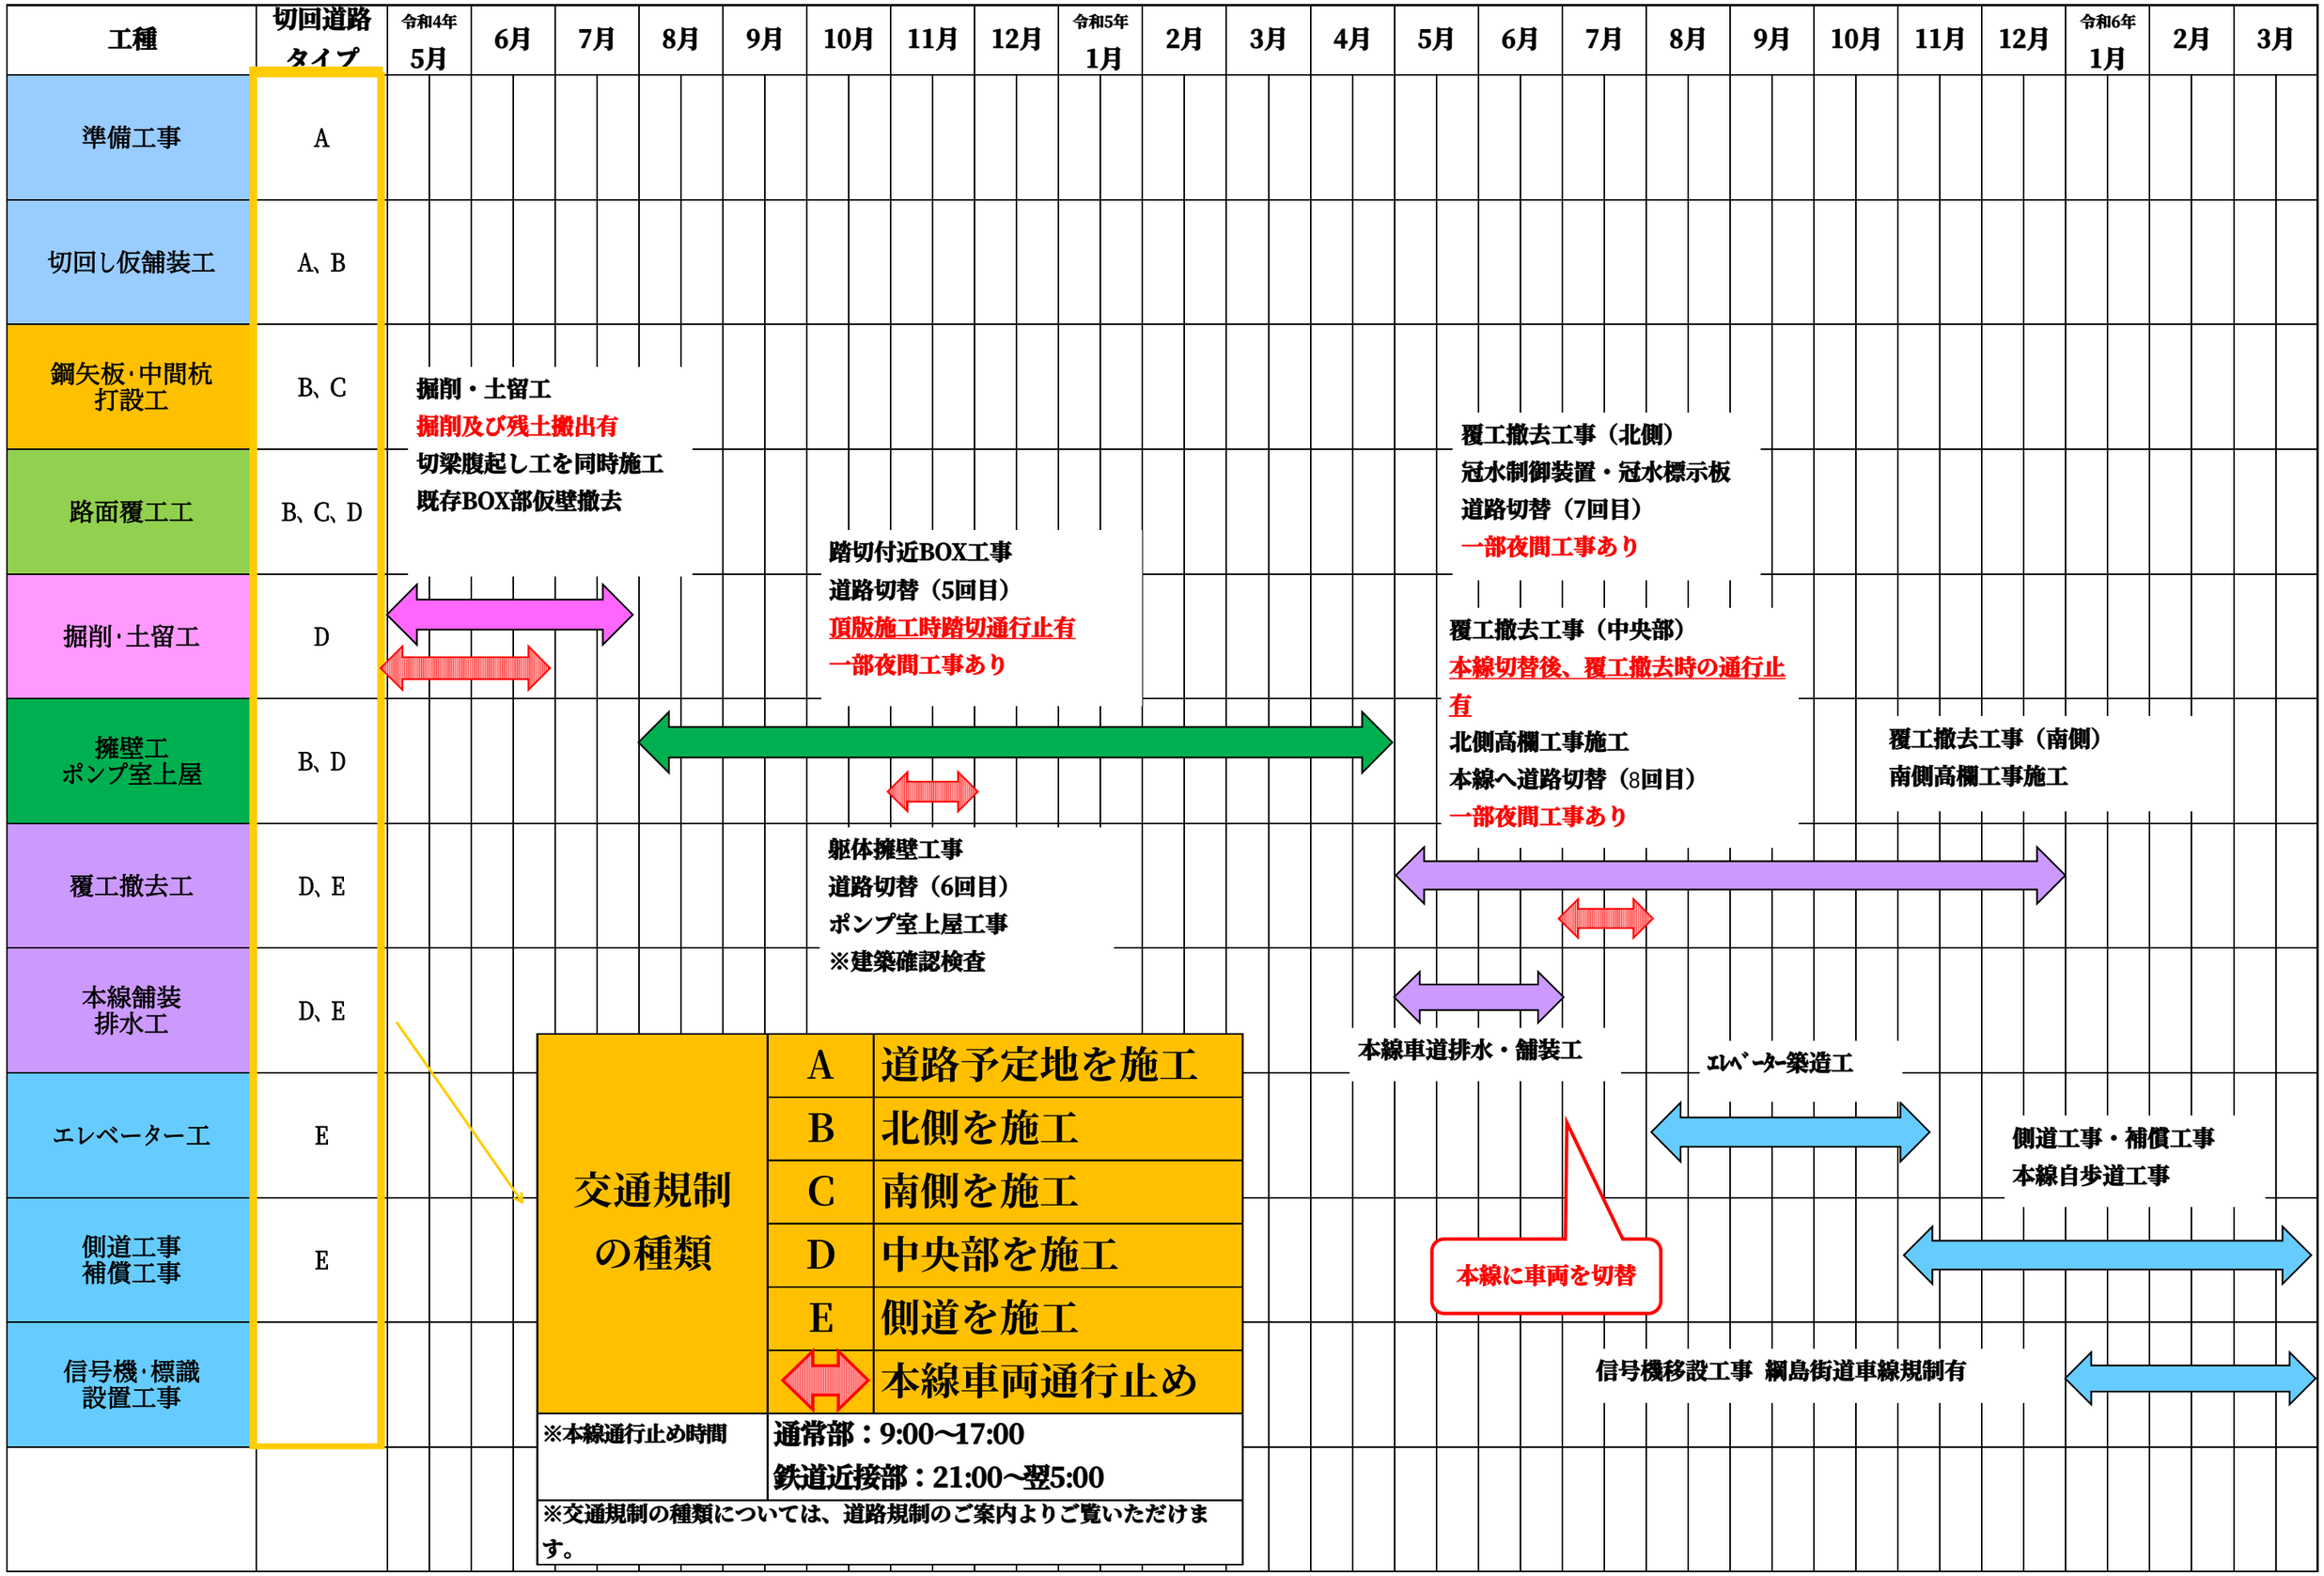
工種
切回道路タイプ
令和4年 5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
令和5年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
令和6年 1月
2月
3月
準備工事
A
切回し仮舗装工
A、B
鋼矢板･中間杭打設工
B、C
路面覆工工
B、C、D
掘削･土留工
D
擁壁工 ポンプ室上屋
B、D
覆工撤去工
D、E
本線舗装 排水工
D、E
エレベーター工
E
側道工事 補償工事
E
信号機･標識設置工事
掘削・土留工
掘削及び残土搬出有
切梁腹起し工を同時施工
既存BOX部仮壁撤去
踏切付近BOX工事
道路切替（5回目）
頂版施工時踏切通行止有
一部夜間工事あり
躯体擁壁工事
道路切替（6回目）
ポンプ室上屋工事
※建築確認検査
覆工撤去工事（北側）
冠水制御装置・冠水標示板
道路切替（7回目）
一部夜間工事あり
覆工撤去工事（中央部）
本線切替後、覆工撤去時の通行止有
北側高欄工事施工
本線へ道路切替（8回目）
一部夜間工事あり
覆工撤去工事（南側）
南側高欄工事施工
本線車道排水・舗装工
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ築造工
側道工事・補償工事
本線自歩道工事
本線に車両を切替
信号機移設工事 綱島街道車線規制有
交通規制の種類
A 道路予定地を施工
B 北側を施工
C 南側を施工
D 中央部を施工
E 側道を施工
本線車両通行止め
※本線通行止め時間
通常部：9:00～17:00
鉄道近接部：21:00～翌5:00
※交通規制の種類については、道路規制のご案内よりご覧いただけます。
